

Cronograma Físico Financeiro

BRG ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS E PROJETOS PARA VIABILIZAR A DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA LOCALIZADA A RUA EXPEDICIONÁRIO MICHEL JACOBÉ CHEIB

Item	Descrição	Part %	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	ENCARGO SOCIAL	
									HORISTA 20%	MENSALISTA 20%
62	PROJETOS	100,00%		18,81%	50,00%	31,19%				
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	98,55%		18,09%	49,27%	31,19%				
62.01.90	PROJETO DE DEMOLIÇÃO	39,46%			50,00%	50,00%				
62.01.91	VISTORIA E RELATÓRIO TÉCNICO DE CONHECIMENTO	15,40%			50,00%	50,00%				
62.01.92	ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE QUANTIDADES E ORÇAMENTO	22,91%			50,00%	50,00%				
62.01.93	RELATÓRIO TÉCNICO CAUTELAR DE ÁREAS EDIFICADAS	20,77%		50,00%	50,00%					
62.20	PROJETOS DE EDIFICAÇÃO POR M2	1,45%		0,73%	0,73%					
62.20.01	CADASTRO DE EDIFICAÇÃO	1,45%		50,00%	50,00%					
Orçamento RDC SP 004/2021		Percentual Global Simples	0,00%	18,81%	50,00%	31,19%	0,00%	0,00%		
		Valor Simples em R\$	0,00	5.435,00	14.445,00	9.010,00	0,00	0,00		
Cronograma Financeiro elaborado por BRG Engenharia Ltda - ME		Percentual Global Acumulado	0,00%	18,81%	68,81%	100,00%	100,00%	100,00%		
		Valor Acumulado em R\$	0,00	5.435,00	19.880,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00		


Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2022

BRG Engenharia Ltda - ME
CNPJ 14.272.924/0001-51

3/HRZ 10/01/22

Engenharia Civil

	Nome	Duração	Início	Fim
1	Demolição Caixa D'Água	87 dias?	16/11/21 08:00	16/02/22 17:00
2	Coordenação	67 dias?	16/11/21 08:00	16/01/22 17:00
3	Serviços Preliminares	37 dias?	16/11/21 08:00	05/01/22 17:00
4	Visoria e Relatório Técnico de Conhecimento	14 dias?	16/11/21 08:00	03/12/21 17:00
5	Visoria	1 dia?	16/11/21 08:00	16/11/21 17:00
6	Relatório	13 dias	17/11/21 08:00	03/12/21 17:00
7	Relatório Técnico Cantaleir de Áreas Edificadas	18 dias	13/12/21 08:00	05/01/22 17:00
8	Levantamento	3 dias	13/12/21 08:00	15/12/21 17:00
9	Relatório Cantaleir	15 dias	16/12/21 08:00	05/01/22 17:00
10	Projetos de Edificação por m²	18 dias	13/12/21 08:00	05/01/22 17:00
11	Visoria de Edificação	3 dias	13/12/21 08:00	15/12/21 17:00
12	Cadastro de Edificação	15 dias	16/12/21 08:00	05/01/22 17:00
13	Projeto Executivo de Demolição	11 dias	06/01/22 08:00	20/01/22 17:00
14	Projeto Executivo	11 dias	06/01/22 08:00	20/01/22 17:00
15	Documentação	11 dias	06/01/22 08:00	20/01/22 17:00
16	Planilha de Quantitativo	11 dias	06/01/22 08:00	20/01/22 17:00
17	Orçamento	11 dias	06/01/22 08:00	20/01/22 17:00
18	Memorial	11 dias	06/01/22 08:00	20/01/22 17:00
19	Entrega Preliminar	11 dias?	21/01/22 08:00	04/02/22 17:00
20	Verificação Prévia - SUDECAP	6 dias?	21/01/22 08:00	28/01/22 17:00
21	Revisão	5 dias?	31/01/22 08:00	04/02/22 17:00
22	Entrega Final	8 dias?	07/02/22 08:00	16/02/22 17:00
23	Verificação Definitiva - SUDECAP	5 dias?	07/02/22 08:00	11/02/22 17:00
24	Emissão Final	3 dias?	14/02/22 08:00	16/02/22 17:00

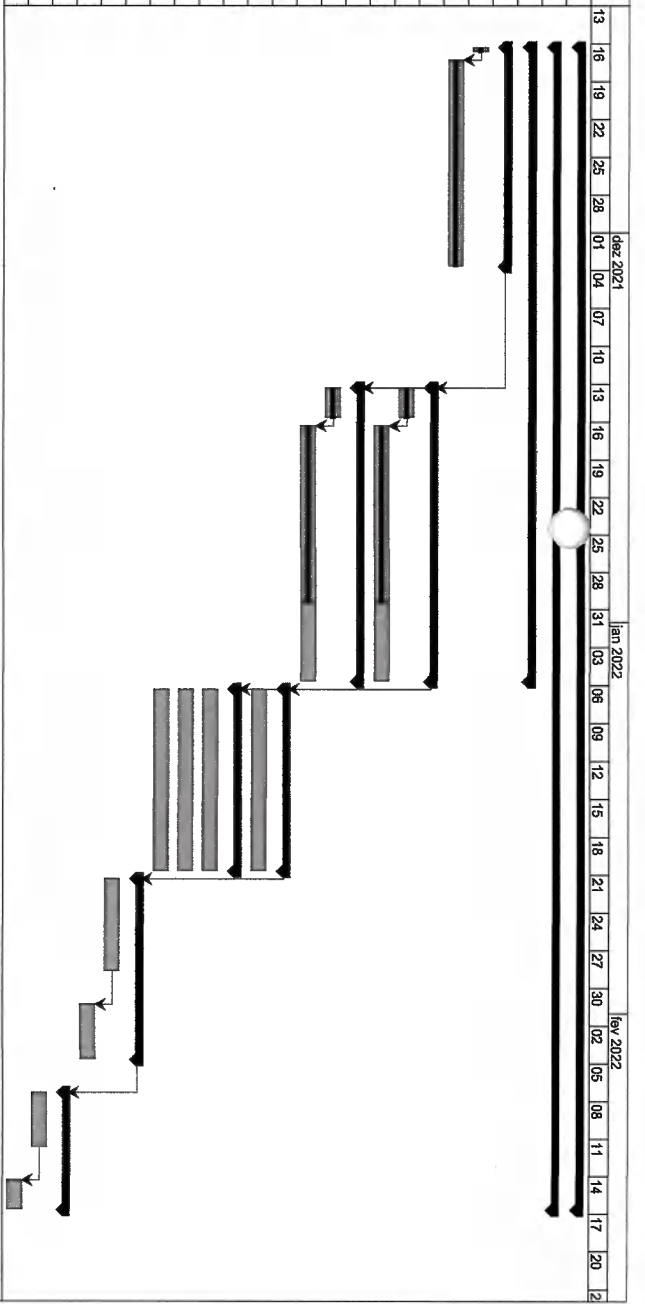

Handwritten signature

Eng. Produção / CMI - [Redacted]

BRG ENGENHARIA

CNPJ: 14.272.924/0001-51

Handwritten signature
10/01/22

Engenheira Civil
